

工程专报

(总第 027 期)

鹤壁市公路管理局

二〇一八年四月十三日

征地拆迁作为公路建设的关键一环，直接制约着工程建设进度。为创造我市在建干线公路建设良好施工环境，市政府多次组织召开在建项目征地拆迁协调会，破解征地拆迁难题，加快推动项目建设进程，取得一些进展，但目前仍有一些工作推进缓慢，截止4月13日，具体情况如下：

【征地拆迁剩余工程量】

(一) 南海路（西段）改建工程

◆道路北侧

1、城乡一体化示范区，高村范围①一排房屋和灰场房屋一角在征地范围内，未拆除。②汽车修理厂房屋未拆迁③灵山变电站路西侧树林及麦田征地拆迁未解决。④现浇盖板涵一道需加长31米，征地未解决。⑤南海港湾东侧过路盖板涵一道未拆迁。⑥高压线一道未迁移。

2、移动、联通通信光缆沿道路东西走向未迁移。

◆道路南侧（城乡一体化示范区）：

鹤壁市普通干线公路在建项目建设

1、高村变电所一道高压地埋线（供冷库、小区使用），未迁移。

2、南海港湾售楼部房屋未拆迁。

3、南北走向高压电线杆3个未拆迁（南海港湾售楼部东）。

4、靠近淇河桥路基范围内有一座坟墓、一片树林和围挡未拆移。

5、亚泰公司所属围墙、门岗房、房基础和轨道公司院前果树、麦田未完成征地拆迁。

（二）S225安平线新老区快速通道改建工程

---淇滨区段

乡镇	村庄	剩余征地拆迁工程量
金山办事处	刘庄	1、4户村民（5亩土地，含500棵杨树）。 2、1座水厂拆迁工作尚未完成。
	庞村	庞村互通立交桥处路北20亩地、1处蔬菜大棚征地拆迁工作未完成。
	辛村	1、辛村1处房屋未拆迁。 2、辛村天桥处有1处水渠，需协调开发区渤海路办事处拆除。
上峪乡	上庄村	1、2处房屋未拆迁。 2、1处广告牌未拆迁。

---淇县段

乡镇	村庄	剩余征地拆迁工程量
庙口乡	王滩村	用地范围内25处房屋未拆迁，无法进场施工。

---市直单位

类别	单位	剩余征地拆迁工程量
电力	供电公司	红线内共有 91 处电力设施需要进行迁移,部分线路已经影响路基和桥梁施工。
信号铁塔	中国铁塔	红线内 1 处铁塔未拆除。
通信	鹤壁通信传输局	红线内 8 处通信光缆需迁移,共计 42 处通信线杆,分处刘庄、辛村天桥、庞村天桥、庞村互通立交、王滩通道、许沟大桥、养护工区、东风渠桥交叉施工路段。

【存在的问题】

(一) S225 安平线新老区快速通改建工程

1、刘庄、辛村、庞村段考古工作进展缓慢,投入考古的人力不足,现尚有多处未开始探测工作,特别是控制性工程庞村互通考古时间尚未确定,严重影响路基施工。

2、红线内所属鹤壁通信传输局需迁移的 8 处通信光缆,内含 66389 部队军用纤芯 2 芯(承担军用业务),迟迟未迁移,严重影响施工进度。


(二) 南海路西段改建工程

1、南海港湾东侧一道灌溉所用盖板涵图纸未设计,村民阻工,要求接长或打井解决灌溉问题,协商未达成一致,此处暂时无法施工。

2、施工单位已进场,但由于城乡一体化示范区征地拆迁工作进展缓慢,没有实质性进展,影响了路基施工及工程的整体推进。

【领导视察】

副市长刘文彪实地督导我市干线公路项目建设

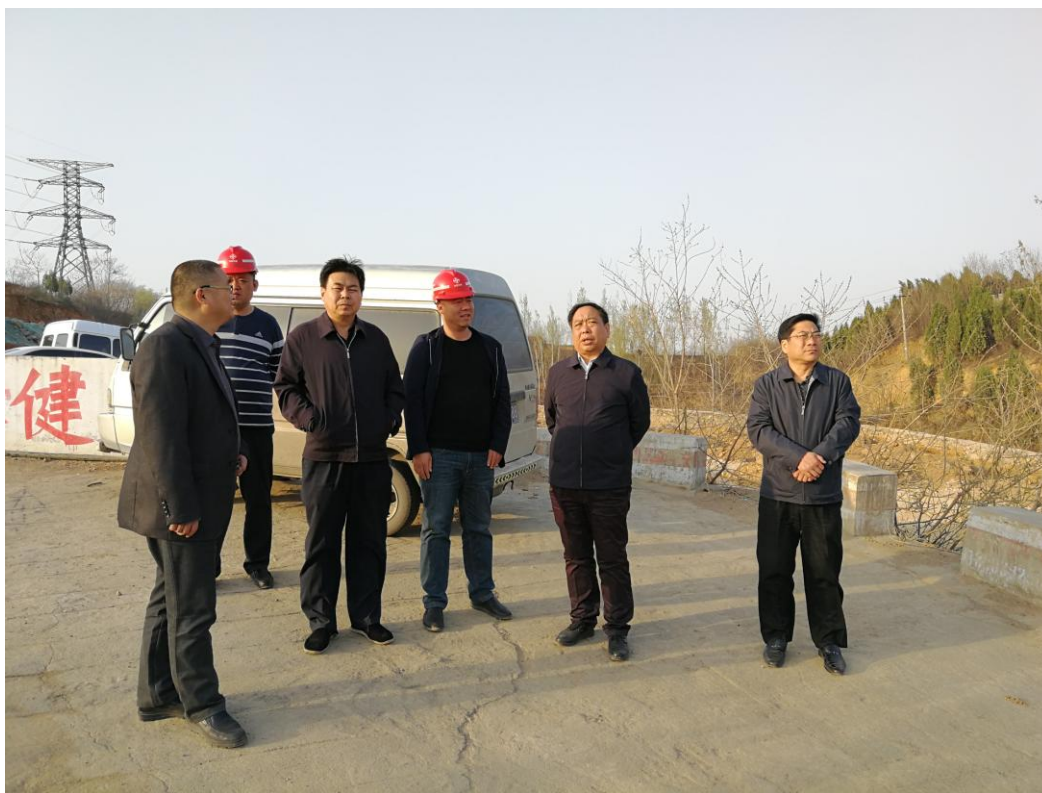

4月9日下午，副市长刘文彪实地督导我市干线公路项目建设，市政府副秘书长牛海民、市公路局党委书记、局长张存福陪同。

刘文彪一行先后到南海路、淇河景观大桥、S225安平线新老区快速通道在建项目进行实地督导，采用现场办公的方式，现场听取工程进度计划、征地拆迁问题汇报，提出整改措施和相关解决办法。刘文彪指出：一是沿线各县区政府要抓紧时间完成剩余拆迁工作，特别是南海路城乡一体化示范区段，一周内完成全部征地拆迁工作。二是科学设计、合理施工，特别是S225安平线新老区快速通道断行施工计划一定要统筹兼顾、慎之又慎；三是坚决做好大气扬尘防治工作，切实提高现场管理环保水平，真

正做到裸土全覆盖、降尘设备齐配套、全过程湿法施工，全面达到工地现场“六个百分之百”环保标准。

【工作动态】

1、4月2日，市公路局党委书记、局长张存福带领干线公路督导组相关人员深入S225安平线新老区快速通道实地查看淇河I桥、淇河II桥、朱家大桥和路基施工进度。针对目前考古工作缓慢已影响路基施工问题进行商讨，张存福在听取辛村考古进展状况后，对考古单位提出要加快推进考古工作，同时处理好扬尘治理的关系，做到既不影响总工期，也不影响后续工作的正常执行，全面落实六个百分之百扬尘措施，进度与扬尘防治工作齐头并进。

2、4月10日，就目前各区征地拆迁情况与各区沟通，督促淇滨区政府加快推进S225安平线征地拆迁，城乡一体化示范区加快南海路西段征地拆迁进度。

3、4月11日，实地勘察S225安平线红线内军用光缆具体所属情况，并将有关问题及时向市政府汇报。

4、4月12日，协调市供电公司与县区乡镇政府电力拆迁对接工作及征地拆迁事宜。

【需要协调解决的问题】

- 1、S225安平线淇滨区段及淇县段剩余征地拆迁。
- 2、南海路西段城乡一体化示范区征地拆迁。

鹤壁市普通干线公路在建项目建设

3、督促文广新局、省文物考古研究院加大刘庄、辛村、庞村段的考古挖掘力度，尽快移交施工路段，促使项目进展。

4、督促 S225 安平线鹤壁通讯传输局加快通讯光缆（含军用电缆）设施的迁移。

报送：刘文彪副市长、牛海民副秘书长

市委督查室、市政府督查室、淇县政府、淇滨区政府、城乡一体化示范区、市交通运输局等。

鹤壁市公路管理局

2018年4月13日印发
